

# Nyhedsbrev til beboerne i Ørstedgården

Nr. 9 - Januar 2019

FÆLLES  
FREM TID

## Kære beboer

Så er vinteren for alvor over os. Overordnet set går det godt med renoveringen af Ørstedgården, men vi har desværre fået melding fra STB Byg om, at projektet igen bliver lidt forsinket.


Forsinkelsen får betydning for de beboere, som skulle flytte tilbage til deres bolig i etape 4 først i juli. På grund af forsinkelsen er det nu besluttet, at etape 4 bliver klar af to omgange:

Ole Rømers Vej 13, 15 og 17    15. juli 2019  
Ole Rømers Vej 19 og 21        15. september 2019

De berørte beboere vil blive kontaktet af genhusningsrådgiver Mette Junge Povlsen ca. tre måneder før hjemflytning for aftale omkring flyttetidspunkt, ny lejekontrakt mv.

Både STB Byg og FællesBo beklager forsinkelsen, og vi håber på jeres forståelse.

Venlig hilsen FællesBo

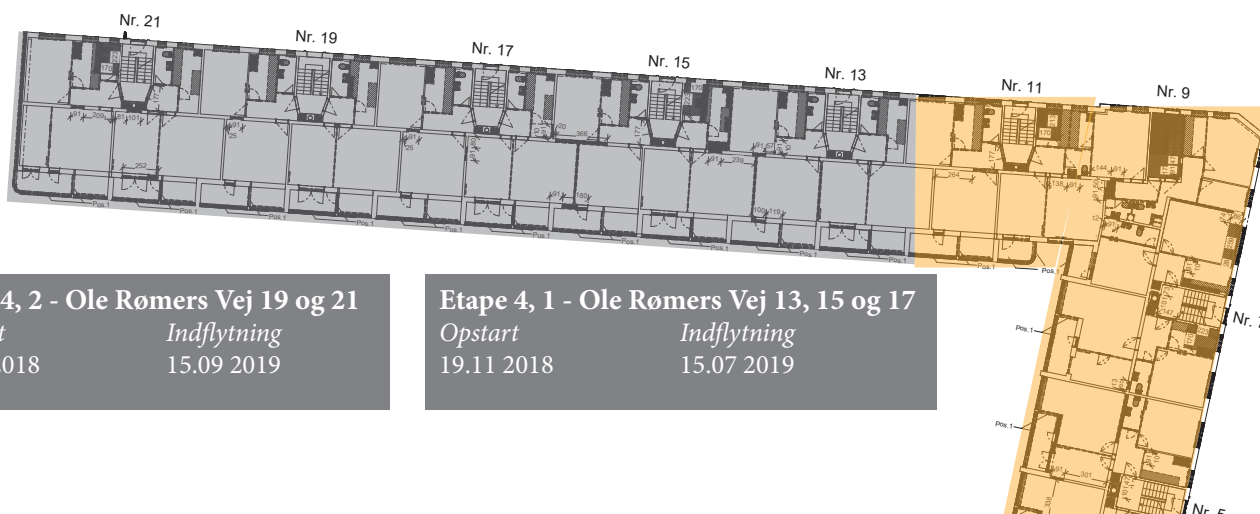

**Etape 4, 2 - Ole Rømers Vej 19 og 21**  
Opstart                      Indflytning  
19.11 2018                      15.09 2019

**Etape 4, 1 - Ole Rømers Vej 13, 15 og 17**  
Opstart                      Indflytning  
19.11 2018                      15.07 2019

## Nyhedsbrevet

Du får løbende nyhedsbreve udgivet af FællesBo med seneste nyt om renoveringen. Du kan finde samtlige nyhedsbreve på [www.fællesfremtid.dk](http://www.fællesfremtid.dk) under Ørstedgården.

Du er også velkommen til at kontakte os på 96 26 58 58, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet.

FÆLLESBO
